


Enunciat

Exercici 1

Després de reunir-nos amb el cap de l'empresa PuigSoft S.L. hem obtingut la següent taula sobre les tasques a desenvolupar en el projecte:

TASQUES	DURADA	INICI
A	4 dies	08/01/2026
B	4 dies	11/01/2026
C	3 dies	11/01/2026
D	10 dies	11/01/2026
E	3 dies	17/01/2026
F	1 dia	15/01/2026
G	1 dia	19/01/2026
H	7 dies	23/01/2026
I	8 dies	19/01/2026

Quan el diagrama estigui acabat, exporta una imatge PNG on es vegi el diagrama complet amb totes les seves tasques.

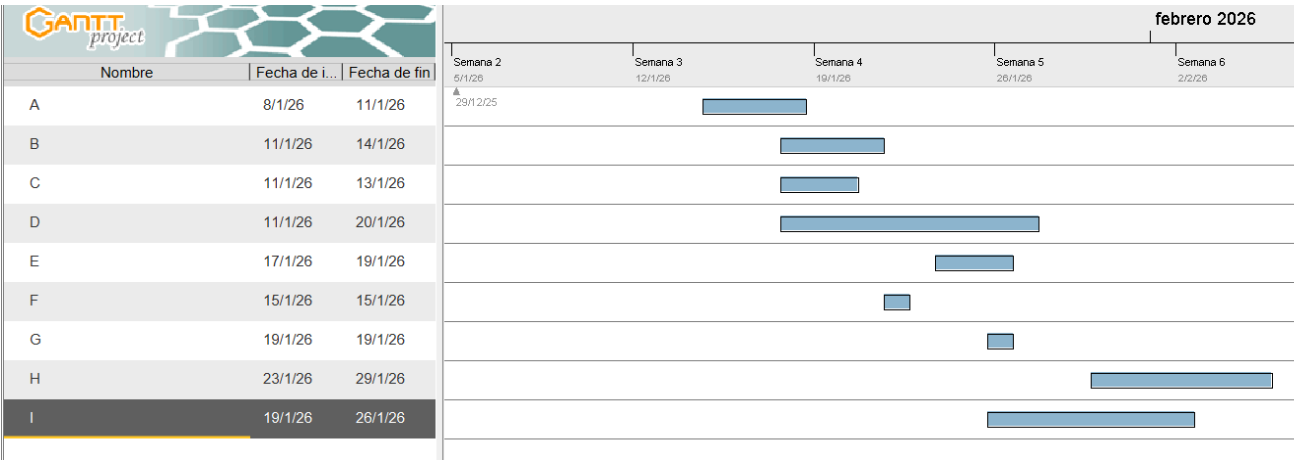

Exercici 2

Acaben de sortir d'una nova reunió amb l'empresa PuigSoft S.L. i ens hem trobat amb un equip diferent del de la primera reunió que, oh sorpresa, ens han donat una versió diferent vers les tasques que s'han de desenvolupar.



Modifica el diagrama de Gantt anterior per a que compleixi amb el següent:

TASQUES	DURADA	Condicions
A	4 dies	Ha de ser la primera tasca a realitzar-se
B	3 dies	Necessita que s'hagi acabat la tasca A
C	3 dies	Comença alhora que la tasca A
D	14 dies	Comença un cop s'hagi acabat la tasca C
E	3 dies	Comença alhora que la tasca B
F	4 dies	
G	1 dia	Comença un cop acabi la tasca F
H	7 dies	
I	1 dia	
J	4 dies	Comença un cop acabi la tasca I

A més a més, ens han proporcionat aquesta informació:

- El projecte comença el dia 08/01/2026
- Disposes de 2 recursos.
- La data d'entrega (objectiu / «milestone») és el dia 11/02/2026 i ha d'aparèixer al diagrama.
- Has d'organitzar les tasques de tal manera que totes les tasques s'hagin acabat abans de la data d'entrega.
- Els recursos han d'estar sempre al 100% de càrrega de feina total (poden fer tasques en paral·lel per sota del 100%, però la suma no pot superar el 100%).
- Si un recurs hi dedica el 50% de càrrega a una tasca, aquesta tasca triga el doble en completar-se. Pots calcular el nou temps amb $T_{nou} = [T_{original} / (P_{càrrega} / 100)]$. Per exemple, una tasca que al 100% dura 4 dies, al 50% dura: $T_{nou} = [4 / (50 / 100)] = [4 / 0,5] = 8$.

Quan el diagrama estigui acabat, exporta una imatge PNG on es vegi el diagrama complet amb tots els recursos i les tasques assignades.

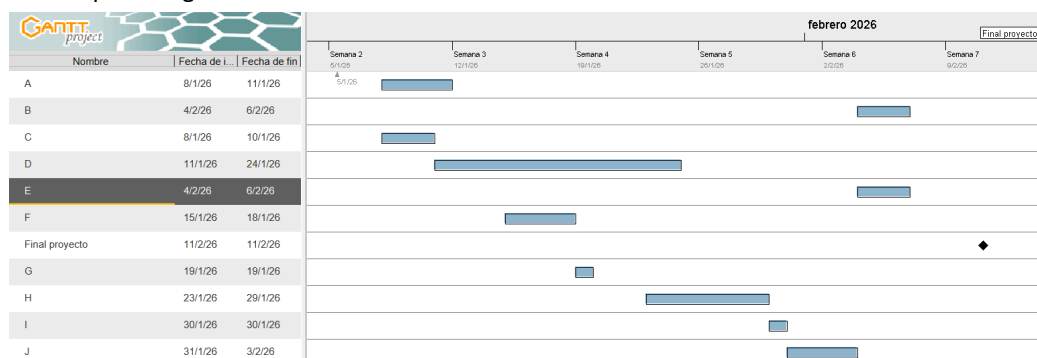

Exercici 3

Després de reunir-nos de nou amb el director de projectes de PuigSoft S.L. ens ha comentat que necessiten avançar la data d'entrega una setmana i que si no la podem complir, hauran de buscar-se un altre proveïdor.

Actualitza el diagrama anterior tenint en compte les mateixes condicions que abans però amb aquests canvis:

- Ara disposes de 3 recursos.
- La data d'entrega (objectiu / «milestone») és el dia 04/02/2026 i ha d'aparèixer al diagrama

Quan el diagrama estigui acabat, exporta una imatge PNG on es vegi el diagrama complet amb tots els recursos i les tasques assignades.

